




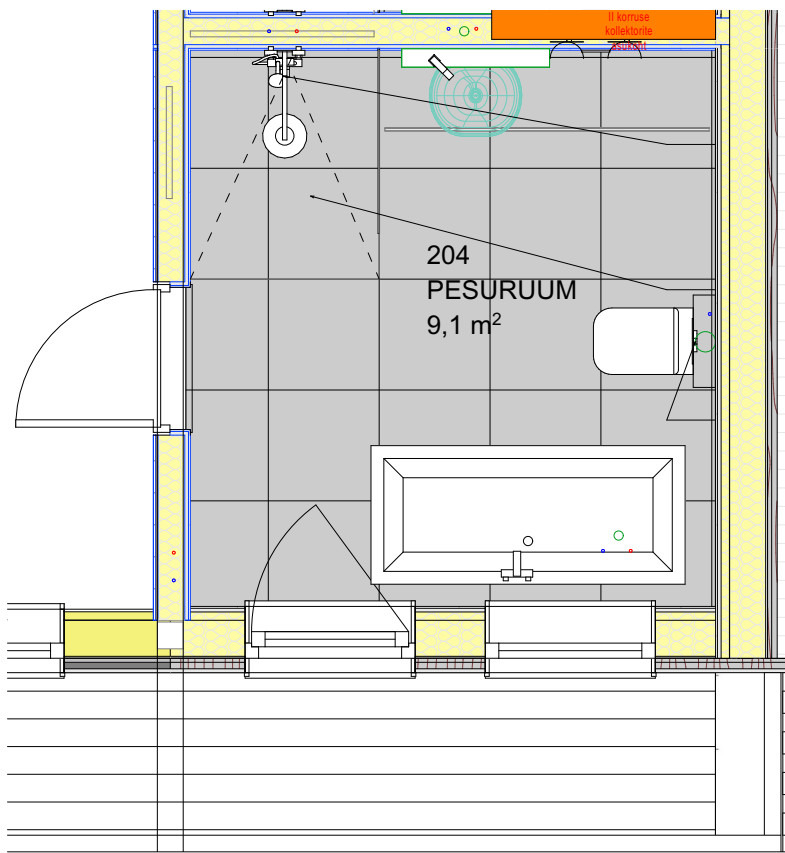


Trapp paigas - tuleb lisada vaid renntrapi
pealne liist - plaadid ilus lõige

Kipsivalu sisse on kraabitud kallak.
Vajadusel vaja korrigeerida

Ülejäänud toa kallaku võimalusel dušhi
renni suunata - minimaalne kalle

WC poti tagune loputuskasti raam plaatida

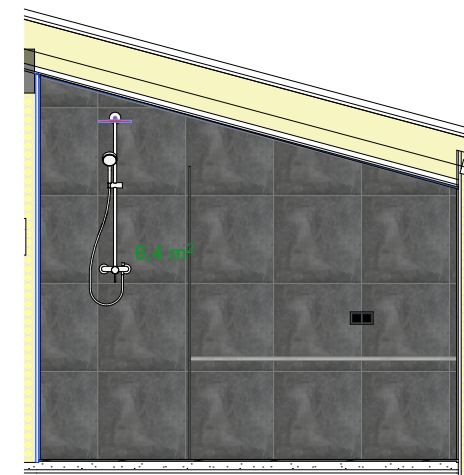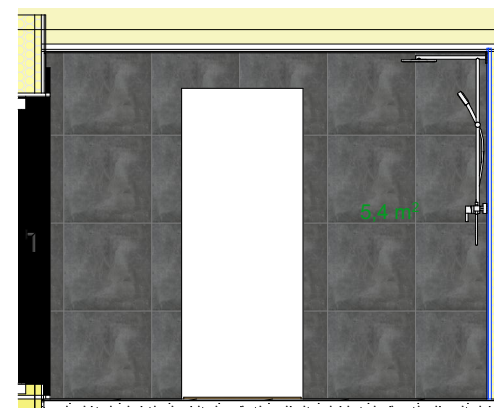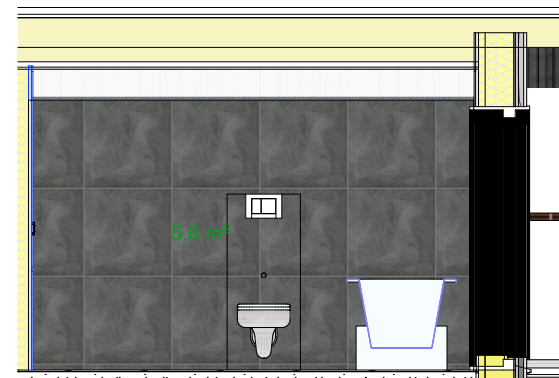

Objekt	1. korrus	06.10.2022
	Plaatimine 2 K	
	©	

Seintes 20 mm TYCROC- hüdro vajalik pole
Põrandas hüdro vajalik - osaliselt materjal olemas




Kallak betooni sisse valatud

Trapp vajalik paigaldada - Unidrain

Seinasees plaaditav nišh- ca
100x300x1200 mm

Leiliruumi plaadid ca 150x150 või 200x200
Kallak minimaalne
Seinte äärde plaaditud porte ääred

Ruum plaaditud- põramdaplaadid
vaja kokku viia

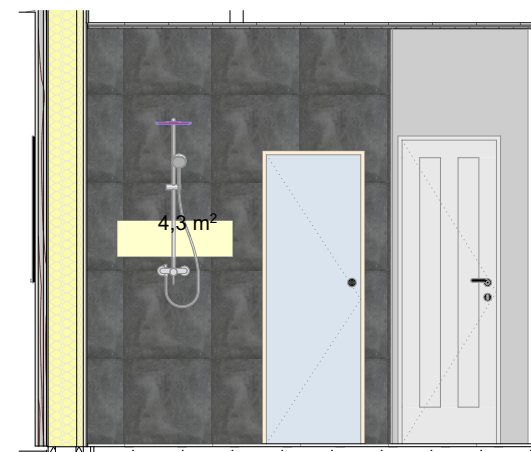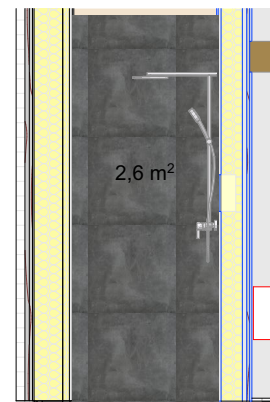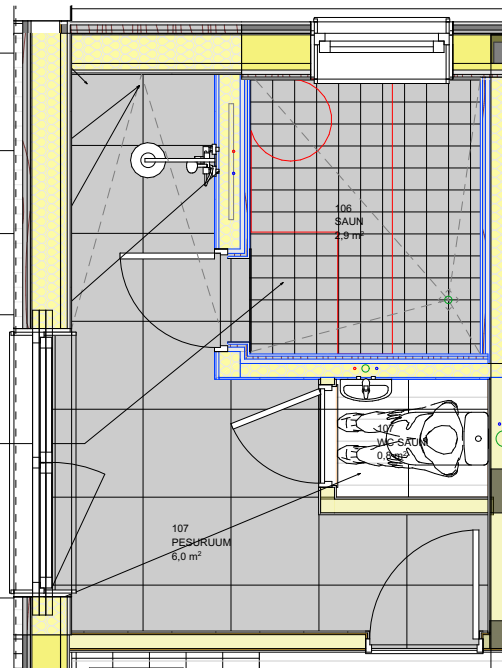

Objekt

Plaatimine 1 K

06.10.2022

©
