


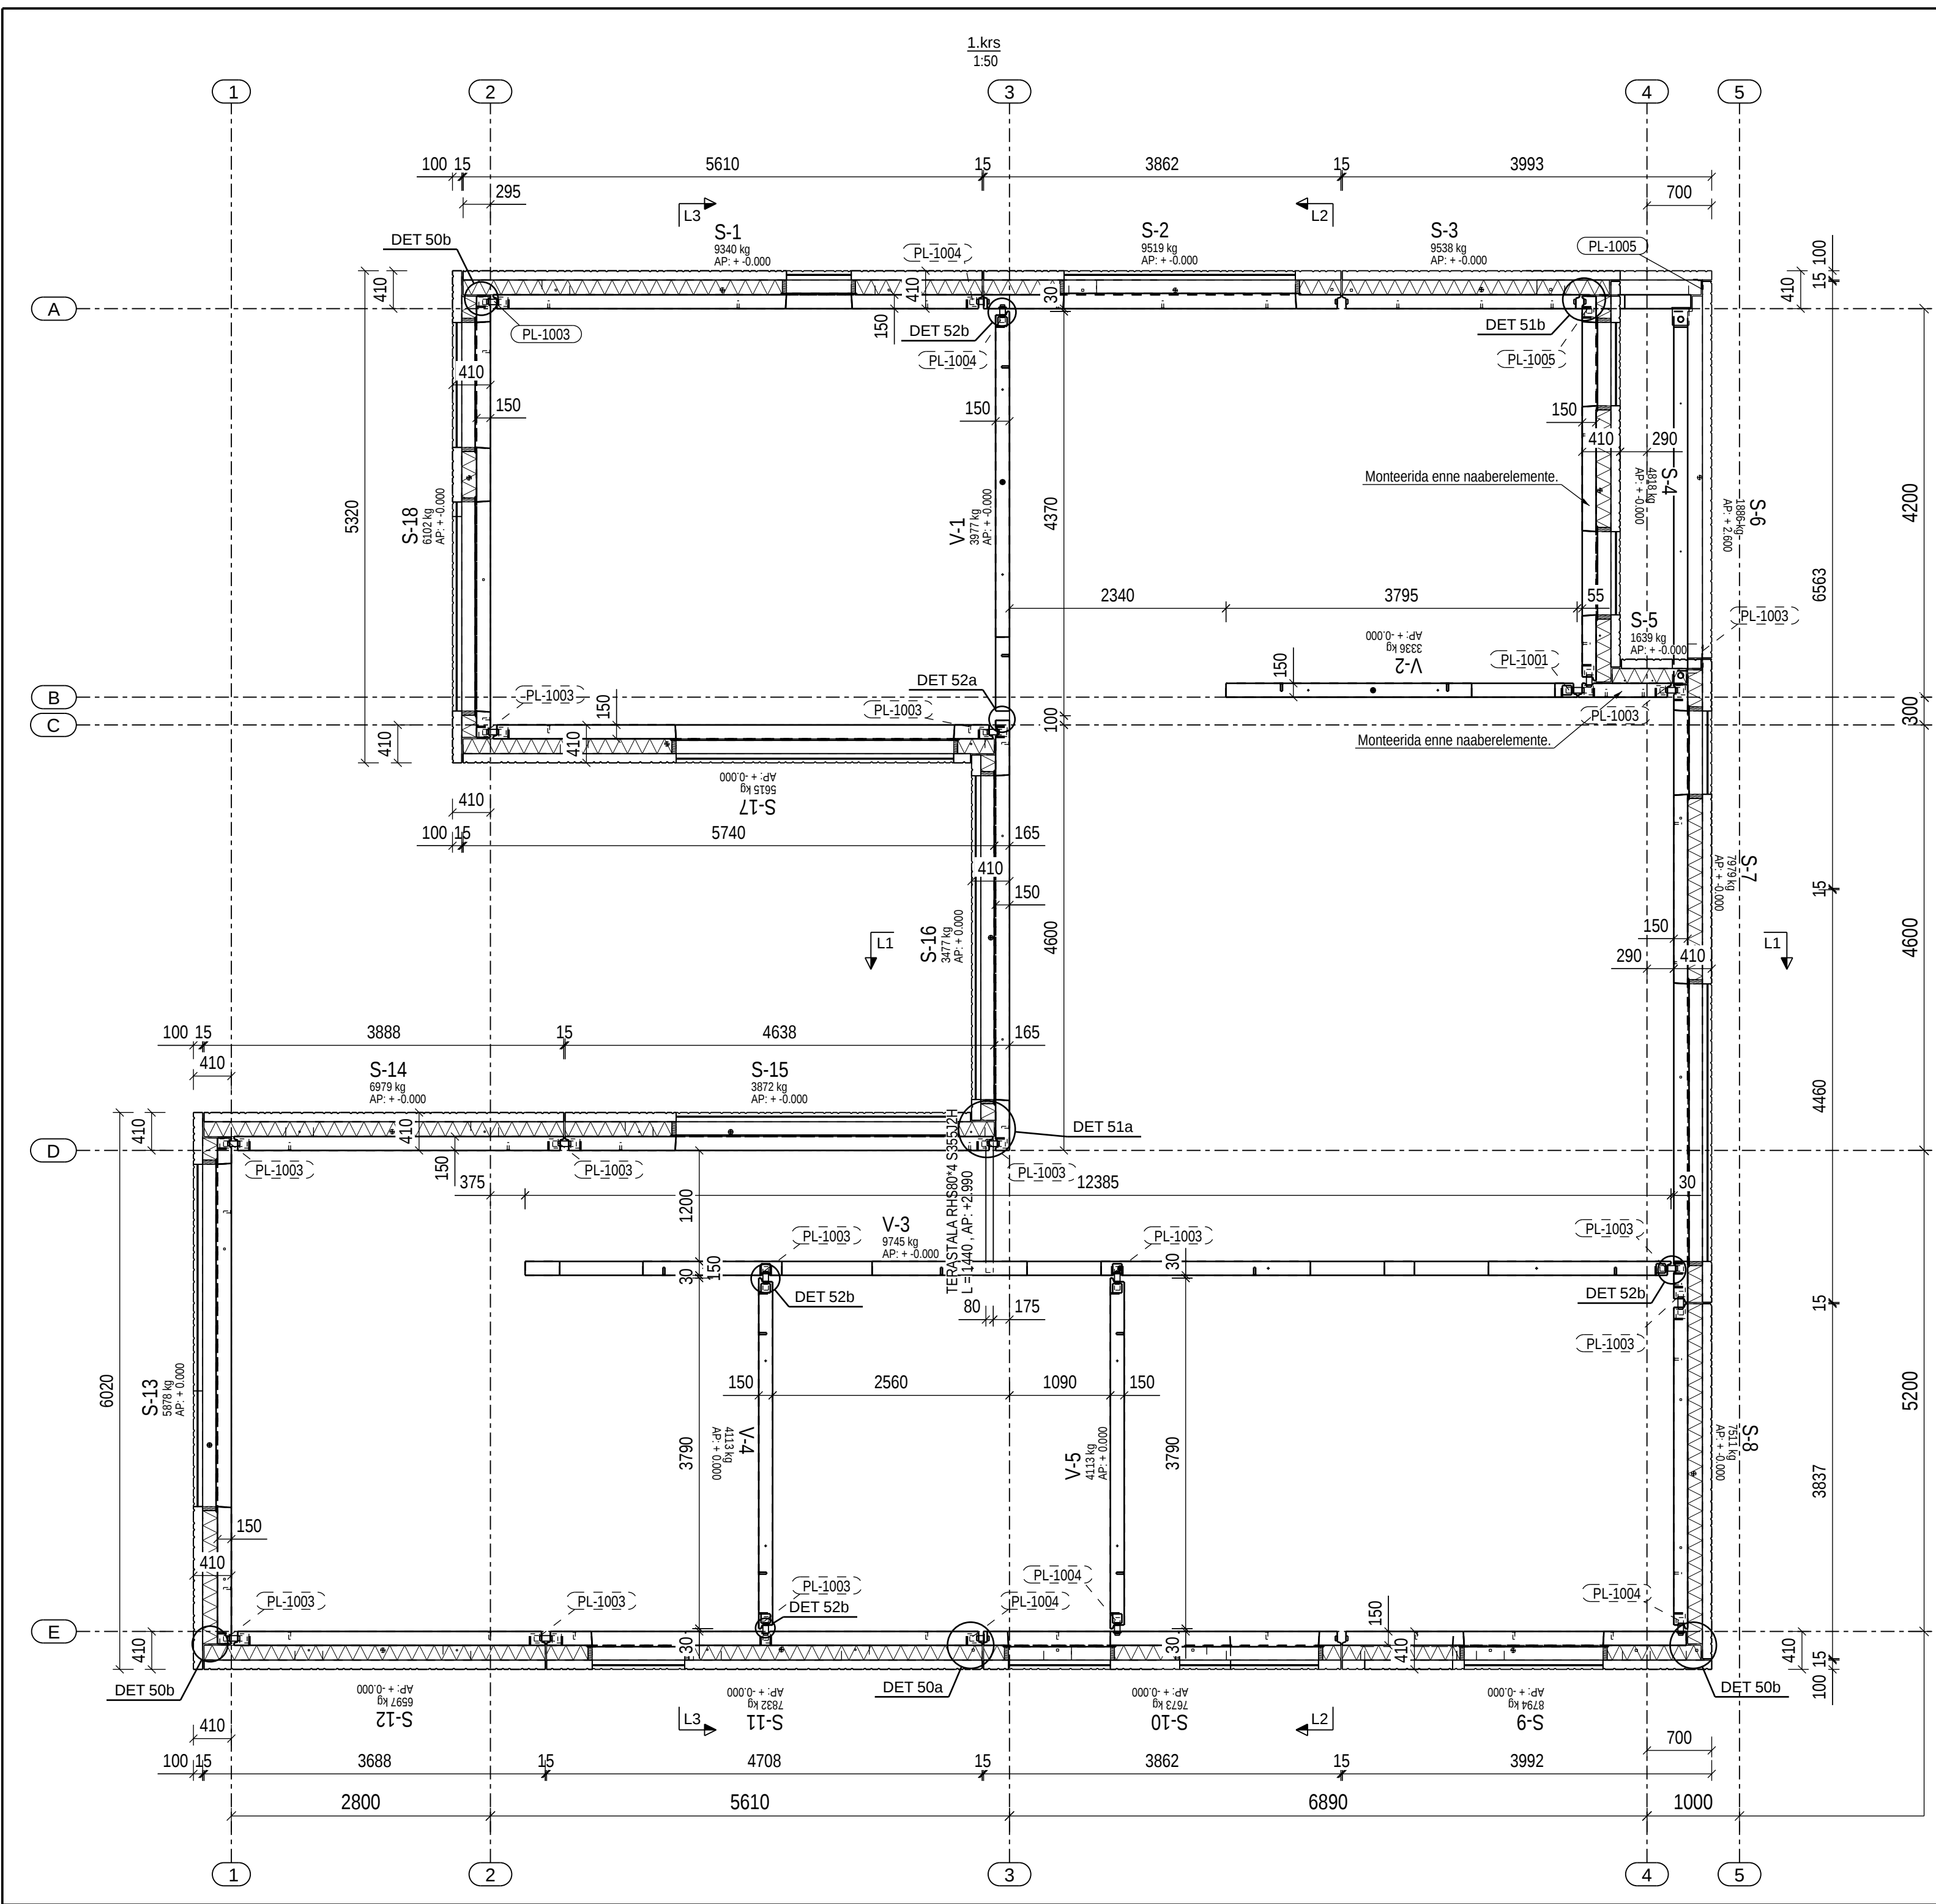

SPETSIFIKATSIOON									
POS.	NIMI	PROFIIL	MATERJAL	ARV [tk]	MÕÕTMED [mm]			MASS/tk [kg]	MÄRKUSED
					h	b	L		
S-1	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	5610	9339.6	
S-2	SISEKOOR	6083*150	C25/30	1	6146	410	3862	9519.4	
S-3	SISEKOOR	6083*150	C25/30	1	6146	410	3993	9537.8	
S-4	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3059	410	4315	4817.8	
S-5	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3055	410	1325	1639.5	
S-6	SISEKOOR	345*150	C30/37	1	1345	410	4345	1885.9	
S-8	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3845	410	3837	7511.4	
S-9	SISEKOOR	6083*150	C25/30	1	6146	410	3993	8794.3	
S-10	SISEKOOR	6083*150	C25/30	1	6146	410	3862	7673.0	
S-11	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	4708	7832.5	
S-12	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	3688	6597.3	
S-13	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	4287	410	6020	5877.6	
S-14	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	3887	6978.9	
S-15	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	4623	3872.1	
S-16	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3845	410	4650	3477.3	
S-17	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	3190	410	5725	5614.7	
S-18	SISEKOOR	2945*150	C25/30	1	4285	410	5320	6102.0	
V-1	VAHESEIN	2945*150	C25/30	1	3057	150	4320	3976.5	
V-2	VAHESEIN	2945*150	C25/30	1	3057	150	3795	3335.9	
V-3	VAHESEIN	2945*150	C25/30	1	3059	150	12385	9744.9	
V-4	VAHESEIN	2945*150	C25/30	1	3057	150	3790	4113.0	
V-5	VAHESEIN	2945*150	C25/30	1	3057	150	3790	4113.0	
B-1	TERASTALA	RHS80*4	S355J2H	1	80	80	1440	13.7	

MÄRKUSED:

ELUIGA: 50a

TULEPÜSIVUS: -

SEINAPANEEL: C25/30 või C30/37 (EVS-EN 206)
VUUGIBEToon: PEENBEToon C25/30 XC1 (EVS-EN 206)
SARRUS: B500B (EVS-EN 10080)

ARMATUURI JÄTKUPIKKUSED:
ø8mm - 450mm; ø10mm - 550mm; ø12mm - 650mm; ø16mm - 900mm; ø20mm - 1100mm

- 1) HOONE KANDVAD SEINAD RAJADA 150mm MONTEERITAVATE RAUBBEToon ELEMENTIDENA.
- 2) SEINAPANEELIDE OMAVAHELISED ÜHENDUSED TROSSAASADEGA PVL80 + ÜLAPINNAS KEEVISÜHENDUS, vt DET.
- 3) SEINAELEMENTIDE PAIGALDAMISEL KASUTATAKSE KÕRGUSLIKUKS RIHTMISEKS PLASTIKUST DISTANSKLOTSE. ELEMENTID PAIGALDATAKSE ÜHTLASELT TOEPINNA ALLA LAOTUD PEENBEToonIS C25/30 SÄNGITUSPINNALE.
- 4) ELEMENTIDE PINNAKLASSID VASTAVALT AR-OSALE.
- 5) KONSTRUKTSIOONE ON LUBATUD KOORMATA PÄRAST PAIGALVALUBEToonI 70% TUGEVUSE SAAVUTAMIST.
- 6) KANDVASSE MÜÜRITISSE SUUREMATE AVADE KUI 100mm TEGEMISEL PIDADA EELNEVALT NÕU PROJEKTEERIJAGA.
- 7) KÕIKIDE MATERJALIDE PAIGALDAMISEL PIDADA KINNI TOOTJA JUHENDITEST.
- 8) TOLERANTSID - VT KONSTRUKTIIVSE OSA SELETUSKIRJAST.
- 9) ELEMENTIDE MONTAAZI SUUND VASTAVALT PLAANIL TOODUD TÄHISELE.
- 10) KÕIK KASUTATAVAD EHITUSMATERJALID PEAVAD VASTAMA HARMONISEERITUD TOOTESTANDARDITELE. EUROOPA LIIDU TEATAJA: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:0024:0061:ET:PDF>

Element	Nimetus	Betoon	Armeering	Tross-aas
S-	Sisekoor	C25/30	#6-150 M.P., 2Ø12 ümb.	PVL80 s600
	Väliskoar	C30/37	#5-150, Ø8 ümb.	
	Postid/sillused		2+2Ø12, Ø8s150	
V-	Sisekoor	C25/30	2Ø12 ümb.	PVL80 s600
	Postid/sillused		2+2Ø12, Ø8s150	

A	12.08.2025	S-6 ja S-7 kuju muudetud.		RPOL
Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus		Proj.
Tellija:		Objekt:		Töö nr:
		ÜKSIKELAMU Viimsi vald, Harjumaa		24180
Vast. projekteerija:		Joonis:		Joonise nr:
		1.krs PLAAN		5-02
Projekteerija:		Projekti osa: Konstruktsioon		Staadium:
		Kuupäev: 31.05.2025 Mõõtkava: 1:50		PP
		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma ... nõusolekuta.		Muudatus:
				A
