
# PALKSUVEMAJA | PÕHIPLAAN JA SEINAVAATED

Välismõõt 2700 × 2950; terrassi katuseulatus 2000; katusekalle 45°; 10.10.2026


## 01 PÕHIPLAAN (proportsioonis)

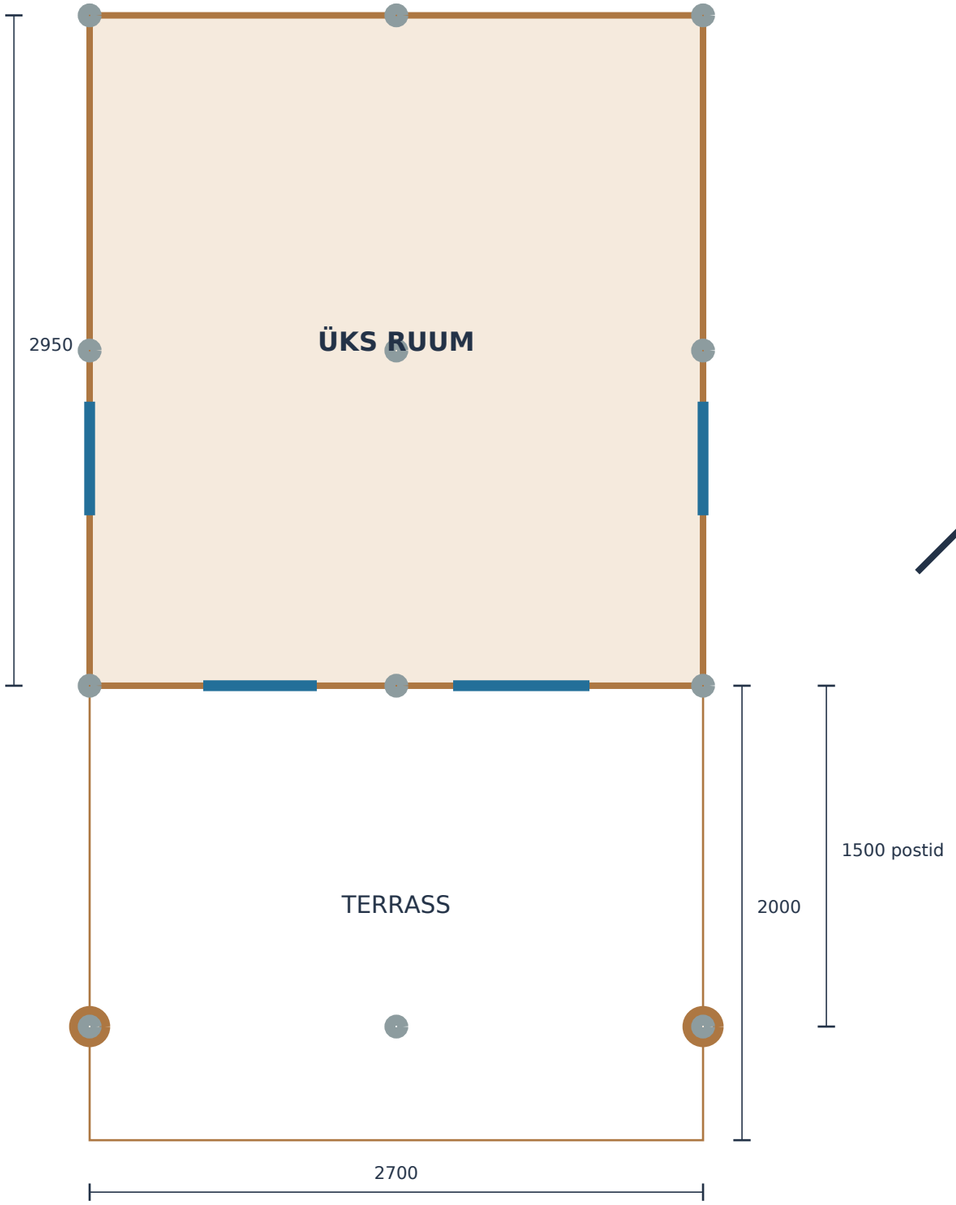


Esisein: vasakul aken 500 × 500; paremal uks 600 × 1500.

Akende/ukse paigutus mõõdetud välisnurkadest; avaehituse varud täpsustab tootja.

## 02 ESISEIN (proportsioonis)

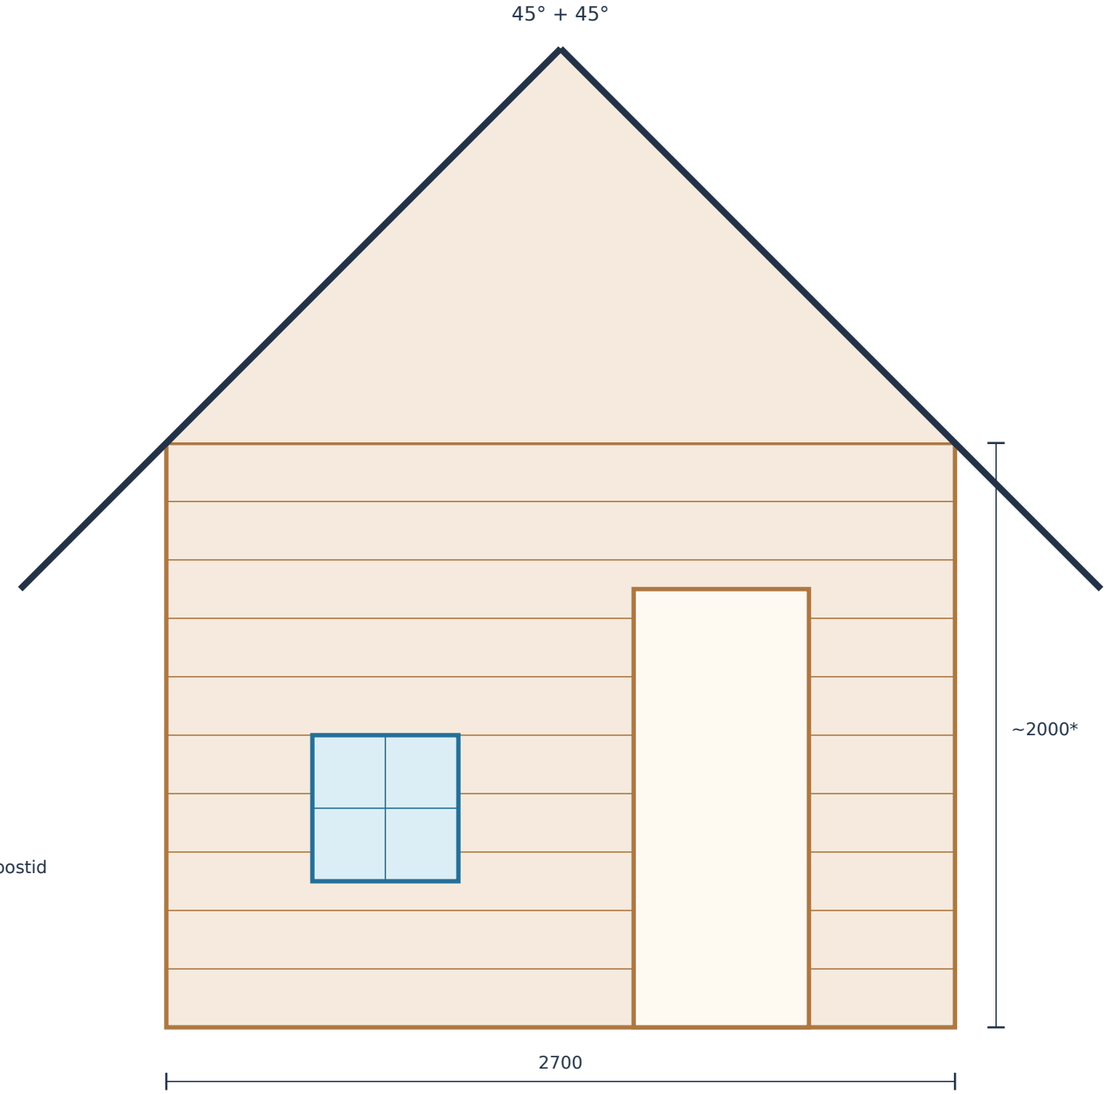


Avade jaotus: 500 | 500 aken | 600 | 600 uks | 500

Aknalaud +500; ukse läve kõrgus täpsustamisel.

* Seina ülaserv ja katuse kõrgused on esialgsed.

# KÜLGVAADE, TERRASSI ASTMED JA TEHNILINE LÄHTEÜLESANNE


Palgikonstruktsiooni tootmise hinnapäring; katusekate, avatäited ja paigaldus eraldi

## 03 KÜLGVAADE – TERRASSI ASTMELINE PALKKONSOOL

Ülemine palk: +2000 mm; teine: +1500 mm; kolmas: +1000 mm.

Varasem +500 mm alumine aste on eemaldatud. Sama lahendus mõlemal külgseinal.

NB! Posti ja palkide koormusülekande sõlm ning sarikate toetus vajavad konstruktsioonikontrolli.

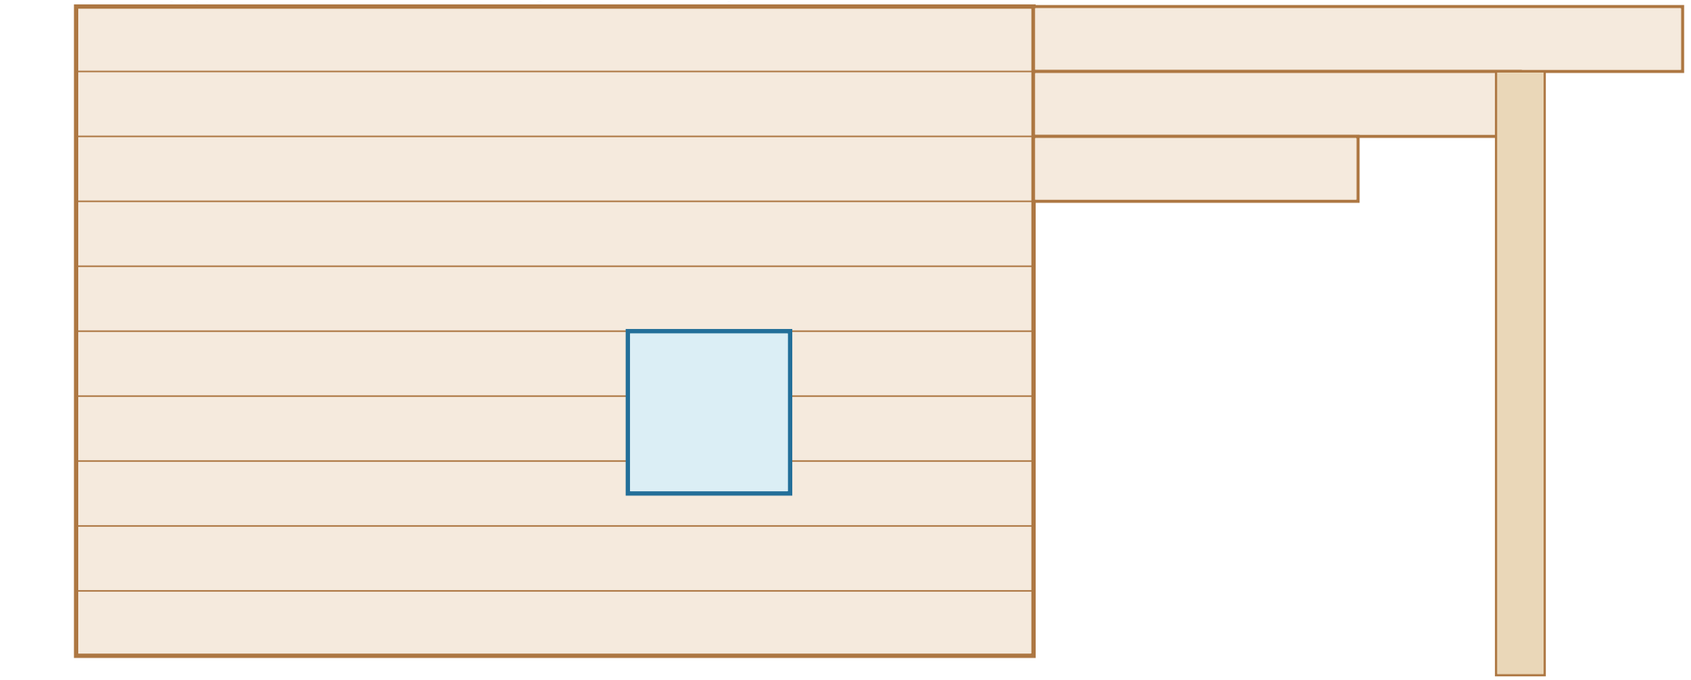


## 04 TOOTMISE LÄHTEANDMED

- Üheruumiline kütmata palksuvemaja; välismõõt 2700 × 2950, sisemõõt 2500 × 2750.
- Seinapalk: tahutud täispuit, paksus 100; eelistatud kõrgus 200–250; väljaulatuv kalasabatapp.
- Esisein: aken 500 × 500 vasakust välisnurgast 500; uks 600 × 1500 paremast välisnurgast 500.
- Mõlemas külgseinas üks 500 × 500 aken; alumine serv +500; asukoht ligikaudu 750 esiseinast.
- Tagaseinas avad puuduvad. Viilseinad jätkuvad katuseharjani.
- Viilkatus 45°; külgräästas horisontaalselt 500; tagaräästas 500; ees ulatus 2000.
- Sarikad 50 × 200, esialgne samm 1000; pennid 50 × 200, alumine serv +2100.
- Terrassil 2 ümarpalkposti Ø150, esiseinast 1500; 12 vaia paigutus esialgne.
- Põrand: kesktala esialgu immutatud 100 × 200; laagid 50 × 150 sammuga 600; EPS 150.

## 05 PAKKUMISE PIIRID JA LAHTISED KÜSIMUSED

Hinnata: seinapalgid, tapid, terrassipostid, põrandatalad/-laagid, sarikad/pennid, nummerdus, tööjoonised, transport.

Välja jäävad: aknad, uks, kokkupanek, katuseplekk ja paigaldus, vaiade rajamine. Roovitus/vooder eraldi hinnareana.

Täpsustada: seina kattekõrgus, vajumisvarud, katuse kõrgused/sadullõige, postisõlm, koormused ja lõplikud avamõõdud.
