

VUNDAMENDI EHITAJALE (N1, N2): XPS KÜLMAKAITSE, SADEMEVEE KÄIVITUSKAEV DP2

Tehakse koos tagasitäitega kuni 47,80 (−0,30) - ENNE seinte ladumist (kontrollpunkt H2a). Joonistele D.300.2000.001-018 rev.5.7 juurde. Plaan - nagu joonistel (tõeline põhi paremale). Mõõdud mm, kõrgused m, ±0,000 = 48,10.


VUNDAMENDI PLAAN (skeem): XPS külmakaitse ümber N1 ja piki N2, sademevee käivituskaev DP2

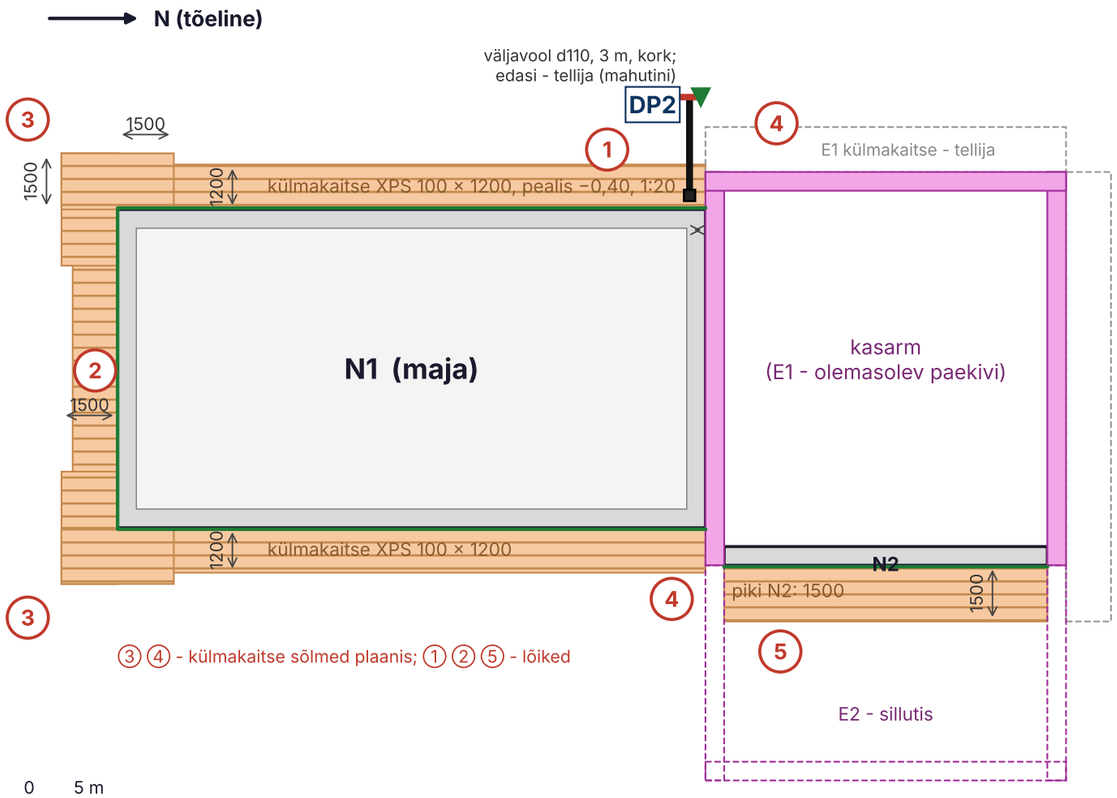


① LÕIGE DP2 JUURES: käivituskaev, külmakaitse, väljavool d110 3 m (≈ 1:20)

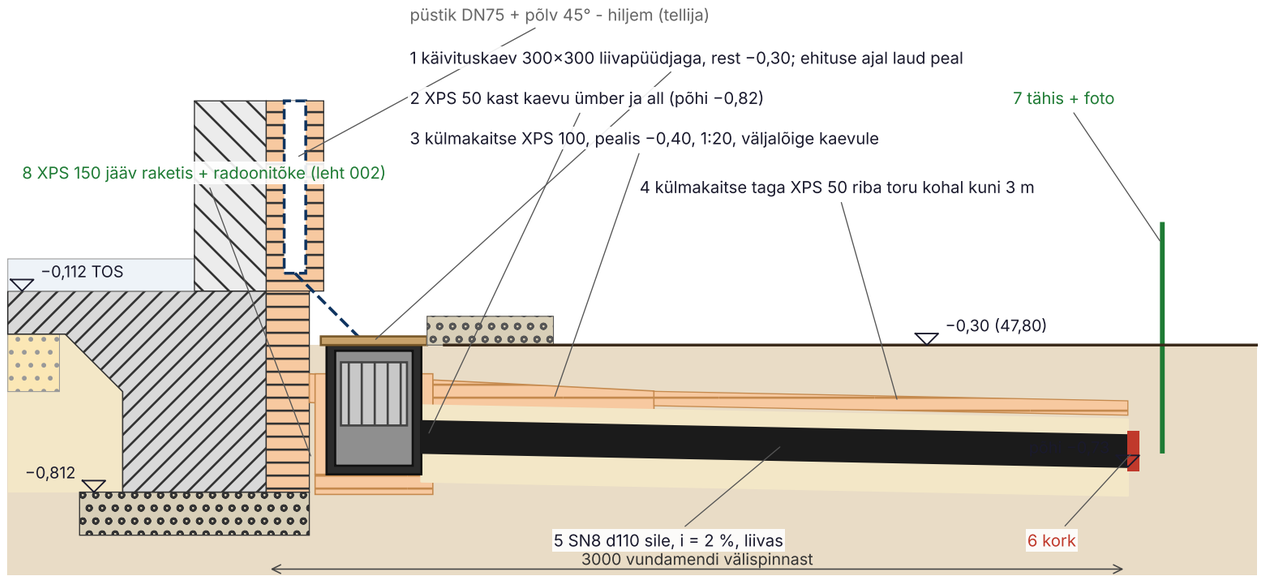


② KÜLMAKAITSE TÜÜPLÕIGE (≈ 1:20)

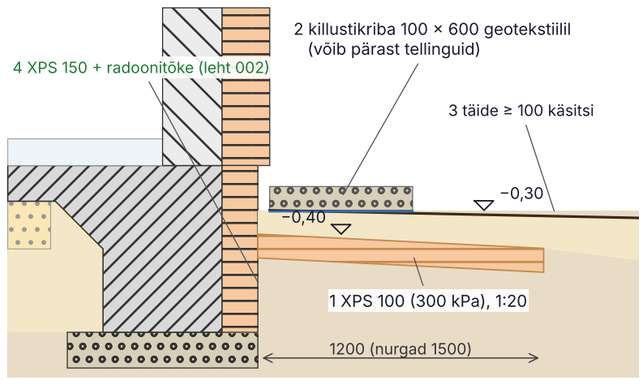


③ VÄLISNURK

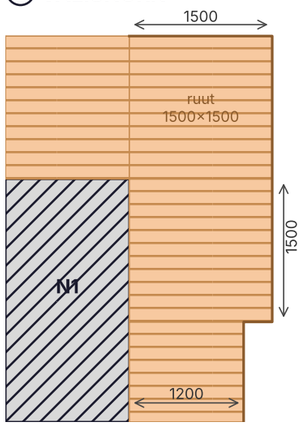

④ LIITUMINE E1-GA

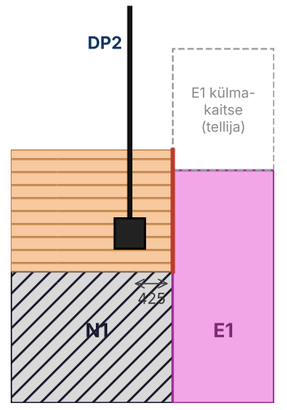

⑤ PIKI N2 SILLUTISE E2 ALL (≈ 1:20)

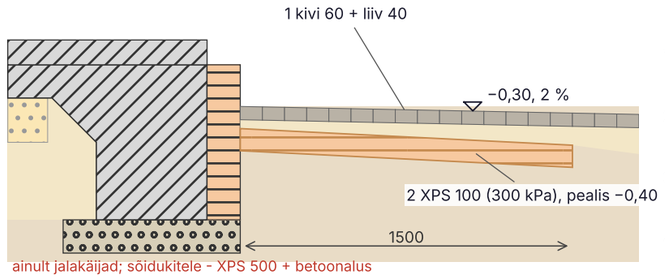

MATERJALID (orienteeruvalt)

XPS 300 kPa, 100 mm - külmakaitse N1 (sh 2 nurka) ja N2	≈ 67 m² (+5 % lõikamine)
XPS 50 mm - kaevu DP2 kast ja riba toru kohal	≈ 1 m²
käivituskaev 300×300 liivapüüdja korviga, pikendus, rest	1 tk
toru SN8 d110 sile (MITTE perforeeritud) + kork d110	3 m + 1 tk
liiv tagasitäiteks / toru ümber	tegelik
killustikriba: geotekstiil kl. 2 / killustik 16/32 (võib hiljem)	≈ 35 m² / 2,5 m³

EI KUULU TÖÖVÕTJA MAHTU (teeb tellija)

- külmakaitse ja PUR-vaht E1 (kasarm) ümber; püstikud DP3-DP6 ja nende ärajuhtimine; DP2 püstik ja toru korgist mahutini
- N1 edelanurga dekoratiivseina vundament: liitub külmakaitse nurgaga väljastpoolt (1500 taga) - külmakaitset mitte lõigata
- kui külmakaitse ristub kanalisatsiooniga KH (DP5 juures, ≈ 0,8 m) - paigaldada toru peale, toru mitte kahjustada

väljavool d110 + kork
külmakaitse XPS 100
E1 külmakaitse - tellija
uus vundament N1 / N2
olemasolev paekivi E1
käivituskaev

TÖÖDE JÄRJEKORD (igal N1 küljel ja piki N2)

0. tala: XPS 150 jääv raketis ja radoonitõke
   paigaldatud enne betoneerimist (leht 002)
1. tagasitäide liivaga kihtidena ≤ 300, k ≥ 0,95 kuni
   külmakaitse alapinnani (≈ −0,50 seina juures), kalle 1:20 seinast
2. DP2: süvend kuni −0,82 - XPS 50 kast, kaev,
   väljavool d110 i = 2 % 3 m pikkuselt, kork, tähis
3. külmakaitse XPS 100 tihedalt XPS 150 vastu; vuugid nihkes;
   nurgad ③; E1 juures tihedalt, ots sirge ④
4. täide külmakaitse peal käsitsi / plaattihendajaga ≤ 100 kg
   kuni −0,30; maapinna kalle 2 % hoonest eemale
5. FOTO külmakaitsest, DP2-st ja väljavoolust mõõdulindiga - ENNE täitmist
   (kontrollpunkt H2a) → tellijale
6. killustikriba - võib pärast tellinguid

! 2 m tsoon fassaadi ääres: ilma tehnika, kraana tugede ja
ladustamiseta (piirdelint)
